



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

NOTA TÉCNICA N.º 055/2024/SAMAC/SAOR/SINFRA


PROCESSO n.º:	SINFRA-PRO-2023/12958
INTERESSADO:	ASSOCIAÇÃO DOS USUARIOS DA RODOVIA MT-129 E EXTENSÃO - AMEX
TERMO DE COLABORAÇÃO:	001-2022
REFERÊNCIA:	Prestação de Contas PARCIAL do Termo de Colaboração 001/2022

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

Introdução

O Termo de Colaboração é fruto de uma parceria da iniciativa privada, entre a Associação dos Usuários da Rodovia MT-129 e Extensão - AMEX e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA e tem como objeto a **Execução da implantação e Pavimentação da Rodovia MT-129 Entr. MT-020 (Rio Alegre) – Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020, totalizando 40,12 KM**, conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, com fornecimento, pelas OSCS, de material, mão-de-obra, ferramental e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços, obras e/ou investimentos.

MAPA DA RODOVIA/TRECHOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO

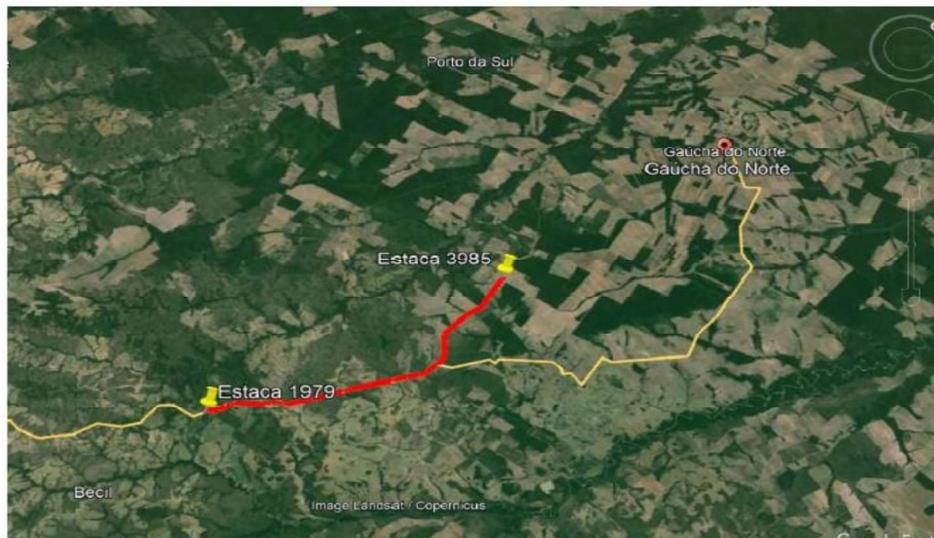

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 12/04/2024 às 16:28:27, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 12/04/2024 às 16:30:14, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 12/04/2024 às 16:44:12 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/04/2024 às 17:02:09.
Documento N.º: 16389334-3651 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16389334-3651>



SINFRADIC202431350


SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

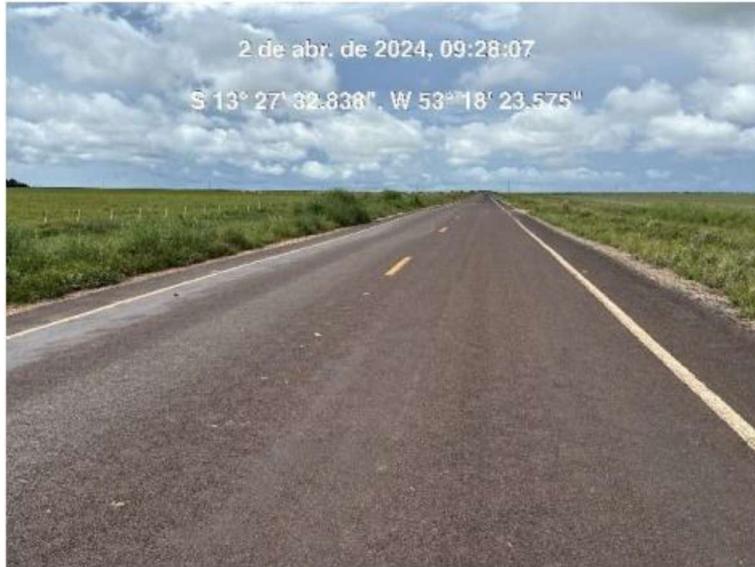

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 12/04/2024 às 16:28:27, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 12/04/2024 às 16:30:14, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 12/04/2024 às 16:44:12 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/04/2024 às 17:02:09.
Documento Nº: 16389334-3651 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16389334-3651>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202431350



Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 12/04/2024 às 16:28:27, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 12/04/2024 às 16:30:14, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 12/04/2024 às 16:44:12 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/04/2024 às 17:02:09.
Documento Nº: 16389334-3651 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16389334-3651>


SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

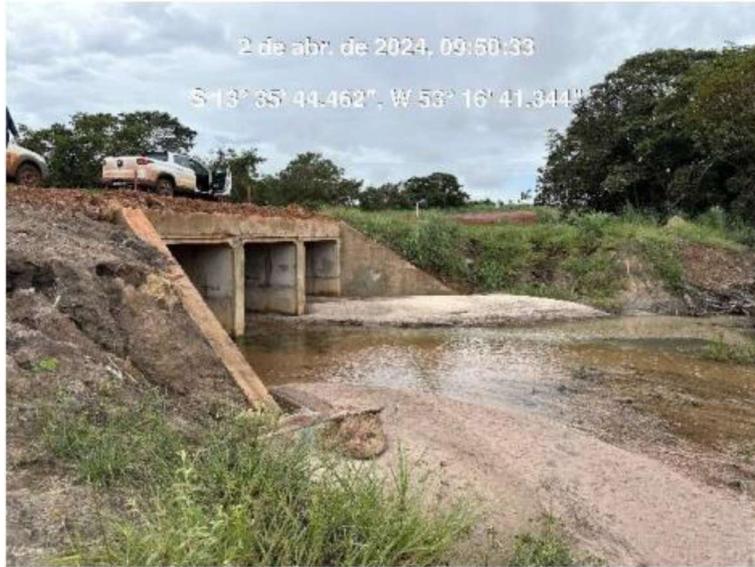

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202431350



Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 12/04/2024 às 16:28:27, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 12/04/2024 às 16:30:14, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 12/04/2024 às 16:44:12 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/04/2024 às 17:02:09.
Documento Nº: 16389334-3651 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16389334-3651>


SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

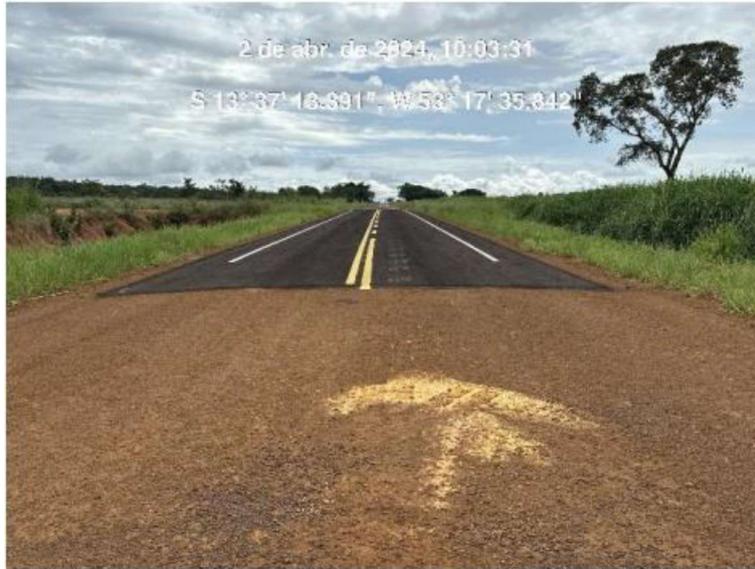

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 12/04/2024 às 16:28:27, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 12/04/2024 às 16:30:14, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 12/04/2024 às 16:44:12 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/04/2024 às 17:02:09.
Documento Nº: 16389334-3651 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16389334-3651>



SINFRADIC202431350

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



REPASSE DE RECURSOS:

Execução

Repasse de Recursos | Rendimento | Orçamento | Liquidação | Pagamento | Execução Física | Termo Aditivo Ex-Ofício | Termo Aditivo | Termo Apostilamento | Aquisições e Contratações

Imprimir Plano de Trabalho

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA | Proponente: ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO | Valor: 49.972.252,00

Objeto: A presente Proposta de Plano de Trabalho tem fundamento legal na Lei Estadual nº 13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019 e no Decreto Estadual nº 167/2019, e tem por objetivo a união de esforços para celebração de Termo de Colaboração entre a SINFRA/MT e a OSC ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO, visando: EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-129, TRECHO: Entr. MT-020 (Rio Alegre) - Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020, com extensão de 40,12 km, conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, COM FORNECIMENTO PELA OSC DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTA E

Período de Execução: 09/06/2022 até 30/06/2024

Número Convênio: 01/2022 | Nº Dossiê: PRO 2022 00776 | Nº Banco: 001 | Nº Agência: 5982-X | Conta: 8111-6 | Situação: Vigente até 30/06/2024 (86 dias) | Incluir Repasse

Nº Orç	Data	Valor Concedido	Alterar	Excluir
1 25101.0001.23.012832-5	03/10/2023	6.000.000,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 25101.0001.22.005408-7	30/06/2022	5.084.547,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 25101.0001.22.012311-9	14/12/2022	5.084.547,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 25101.0001.23.006951-5	28/06/2023	8.088.665,88	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 25101.0001.23.006950-7	28/06/2023	2.070.428,12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 25101.0001.23.012837-9	03/10/2023	651.415,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 25101.0001.23.012838-7	03/10/2023	938.798,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 25101.0001.23.012839-5	03/10/2023	5.348.584,50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Total Repasse R\$ 33.276.986,00

Avançar >>

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA/DIC/2024/31350



Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 12/04/2024 às 16:28:27, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 12/04/2024 às 16:30:14, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 12/04/2024 às 16:44:12 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/04/2024 às 17:02:09.
Documento Nº: 16389334-3651 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16389334-3651>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Conclusão

Considerando a prestação de conta parcial protocolada sob nº SINFRA-PRO-2023/12958 referente ao termo de colaboração 001/2022 firmado entre a Secretaria de Estado e Infraestrutura e Logística – SINFRA e a Associação dos Usuários da Rodovia MT 129 e extensão –AMEX.

Considerando a vistoria realizadas pela Consórcio Supervisor ENGEVIA MT na qual originou a **Nota Técnica NTS59386MT17124** documento este, que restou informar que a referida parceria, a execução da implantação e Pavimentação da Rodovia MT-129 tendo como executora a Organização da Sociedade Civil - Associação dos Usuários da Rodovia MT-129 e Extensão– AMEX, **esta sendo executada conforme o planejado e se encontra apto para que seja dado devido prosseguimento e andamento ao Termo de Colaboração nº 0001-2022.**

Considerando, portanto, o que preceitua o artigo 26 da Lei Estadual 10.861, de 31 de março de 2019, que determina a instituição de Comissão de Monitoramento;

Considerando o que preceitua os artigos 51 a 54 do Decreto Estadual 167, de 12 de julho de 2019;

Considerando a obrigatoriedade de garantia da impessoalidade e transparência no monitoramento, fiscalização a avaliação dos Termos de Colaboração e de Fomento firmados com as OSCs;

Considerando **PORTARIA Nº 92/2023/GSEIL/SINFRA**, que institui os membros da Comissão de monitoramento;

Esta Comissão de Monitoramento e Parceria constatou a viabilidade técnica, econômica, o atendimento ao interesse público, a melhora da trafegabilidade e conclui que os serviços estão sendo executado dentro das normas técnicas conforme o Plano de trabalho.

Portanto, **APROVAMOS** a Nota técnica encaminhada pela supervisora, aprovamos a Prestação de Contas parcial e somos de **PARECER FAVORÁVEL** a continuidade dos trabalhos do Objeto firmado no Termo de Colaboração 001-2022.

Cuiabá, 12 de abril de 2024.

Comissão de Monitoramento e Parcerias:

**ENG.º LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO
FILHO**
Membro da Comissão de Monitoramento
SAMAC/SINFRA

ENG.º IVAN BARROS FROTA
Membro da Comissão de Monitoramento
SAMAC/SINFRA

RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG
Coordenador da Coordenadoria de Parcerias
COPAR/SAMAC/SAOR/SINFRA

De Acordo

ENG.ª NIVIA CALZOLARI
Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por RODRIGO APARECIDO RODRIGUES ABEGG - COORDENADOR / COPAR - 12/04/2024 às 16:28:27, IVAN BARROS FROTA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCOR - 12/04/2024 às 16:30:14, LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO - COORDENADOR / CCOR - 12/04/2024 às 16:44:12 e NIVIA CALZOLARI - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/04/2024 às 17:02:09.
Documento Nº: 16389334-3651 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16389334-3651>



SINFRADIC202431350

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA

GESTOR DE PARCERIAS:	JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
PARECER/PROCESSO:	(X) PARCIAL nº SINFRA-PRO-2023/12958 () FINAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC):	Associação dos Usuários da Rodovia MT-129 e Extensão - AMEX
CNPJ:	03.272.177/0001-35
TERMO DE COLABORAÇÃO:	001-2022
Nº PROCESSO:	SINFRA-PRO-2022/00776
OBJETO DA PARCERIA:	Execução da implantação e Pavimentação da Rodovia MT-129 Entr. MT-020 (Rio Alegre) – Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020
MUNICÍPIO:	Gaúcha do Norte MT
VALOR DA PARCERIA:	R\$ 47.998.125,97
VALOR SINFRA:	R\$ 40.798.407,07
VALOR NÃO FINANCEIRO OSC:	R\$ 7.199.718,90
DATA ASSINATURA:	09/06/2022
DATA PUBLICAÇÃO:	13/06/2022

II. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei MROSC nº 13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019, Decreto Estadual 167/2019 e 227/2019;

O Gestor da Parceria é agente público responsável pela gestão da parceria, designado pelo administrador público através de ato publicado em meio oficial de comunicação, como poderes de controle e fiscalização – é o servidor responsável pela área técnica do objeto pactuado.

Conforme Art. 53 – São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação:

III – emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual será submetido ao Gestor da Parceria a fim de subsidiar elaboração do Parecer Técnico Conclusivo.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 15/04/2024 às 08:40:53.
Documento Nº: 16397936-4129 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16397936-4129>



SINFRA/DIC/2024/31475

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

A – GESTÃO DA PARCERIA

Diante do relatório da Nota Técnica da Execução do Objeto, constatou-se que a parceria está sendo executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

B – CUMPRIMENTO DAS METAS

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no relatório da nota técnica da comissão de monitoramento e avaliação, a execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

A obra está sendo executada dentro dos padrões, de acordo com as normas vigentes bem como acompanhamento de equipe e todo o controle de execução e qualidade.

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria está **cumprindo satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

C – BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que:

Proporcionara conforto a população, irá melhorar as condições de limpeza na rodovia e faixa de domínio, contribuindo para saúde pública, e proporcionar níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da pavimentação da rodovia MT-129. As Obras contemplam também infraestruturas complementares como a implantação de sistema de drenagem.

D – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO

Ainda não foi realizada a pesquisa de satisfação. A Comissão de Monitoramento e Avaliação irá solicitar para a Associação realizar a pesquisa de satisfação sobre a obra.

E – SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE FORAM OBJETO DA PARCERIA

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 15/04/2024 às 08:40:53.
Documento Nº: 16397936-4129 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16397936-4129>



SINFRA/DIC/2024/31475

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado nível de satisfação.

F – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil está atualizando no site: <http://associacaomt129.com.br> as informações referentes ao Termo de Colaboração.

IV. OBSERVAÇÕES

A Comissão de Monitoramento e Avaliação solicita junto a Associação que faça a atualizações referente a obra do referido Termo em questão.

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto e após verificado o cumprimento parcial do objeto acolho a aprovação parcial da prestação de contas.

Cuiabá, 15 de abril de 2024.

Elaborado por:

ENG° JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
Gestor da Parceria

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 15/04/2024 às 08:40:53.
Documento Nº: 16397936-4129 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=16397936-4129>



SINFRADIC202431475

SIGA
